

BALLOO PROJECT STATUS

Версия: 2.0.0 (Updated)

Дата: 2026-06-14

Статус:  In Development (Phase 1)

Дедлайн Phase 1: 2026-06-22

Владелец: Оберюхтин Иван Анатольевич (o8eryuhtin@yandex.ru)

EXECUTIVE SUMMARY

Показатель	Значение
Общий прогресс	~70%
Phase 1 прогресс	~75%
Phase 2 прогресс	~10%
Документация	 98%
Код	 60%
Тесты	 15%
Деплой	 45%

TICKETS STATUS

Завершённые тикеты

Ticket	Название	Статус	Файлы	Прогресс
DESIGN-RECONSTRUCTION-001	Design System Reconstruction	 Complete	16	100%
ACCESS-POLICY-001	Access Control Policy	 Complete	39	100%
AUTH-PROVIDERS-001	Authentication Providers	 Complete	20+	100%
BALLOO-BUILD-20260614-001	Build Specification Phase 1-2	 Complete	1	100%
BALLOO-BUILD-20260614-002	balloo.su + core-brand → Phase 1	 Complete	1	100%

Всего завершено: 5 тикетов

Всего файлов: 77+

Активные тикеты

Ticket	Название	Статус	Дедлайн	Прогресс
BALLOO-BUILD-20260614-003	Phase 1 Implementation	In Progress	2026-06-22	50%
BALLOO-BUILD-20260614-004	Ubuntu Deployment Setup	In Progress	2026-06-22	40%

 NODES STATUS (8 для Phase 1-2)

Priority	Node	Hostname	Group	Статус	Готовность
1	balloo.su	balloo.su	E	In Dev	60%
2	working	working.balloo.su	D	In Dev	50%
3	messenger	messenger.balloo.su	E	Ready	85%
4	admin	admin.balloo.su	B	Not Started	20%
5	kodegen	kodegen.working.balloo.su	A	Not Started	10%
6	workdocs	workdocs.working.balloo.su	B	In Dev	45%
7	nodes-switcher	nodes-switcher.working.balloo.su	A	In Dev	55%
8	api	api.working.balloo.su	D	In Dev	50%

Узлы отложены до Phase 3: 12 узлов (alpha, files, docs, future, и др.)

 AUTH PROVIDERS STATUS (3 для Phase 1)

Provider	Type	Статус	Готовность
yandex-id	External OIDC	Ready	90%
email-password	Local credentials	Ready	95%
phone-3char-code	Phone OTP (Android SMS)	In Dev	40%

 ACCESS ROLES STATUS (4 для Phase 1)

Role	Authority	Статус	Users Assigned
creator-superadmin	L10	☒ Active	1 (Оберюхтин И.А.)

Role	Authority	Статус	Users Assigned
delegated-node-admin	L8	● Config	0
company-staff	L6	● Config	0
sandbox-operator	L3	● Config	0

Плановая нагрузка: 120,000 пользователей

Первые пользователи: 6,000 (1,000 сотрудников + 5,000 тестировщиков)

CORE PACKAGES STATUS

Package	Version	Статус	Готовность	Notes
core-types	0.1.0	☑ Ready	95%	~50 типов
core-config	0.1.0	● In Dev	60%	Node configs
core-i18n	0.1.0	☑ Ready	85%	ru, en
core-theme	0.1.0	☑ Ready	90%	light, dark, russia
core-brand	0.1.0	☑ Ready	100%	Logo (JPG/PNG/SVG), COMPANY_INFO, assets/README.md
core-ui	0.1.0	● In Dev	50%	~30 компонентов
core-docs-schema	0.1.0	● In Dev	40%	Doc structure

TESTING STATUS

Type	Framework	Статус	Coverage	Target
Unit tests	Jest	● Low	15%	35%
Integration tests	Supertest	● Low	10%	35%
API tests	Supertest + Jest	● Low	12%	35%
E2E tests	Playwright	○ Phase 3	0%	—

Критичные модули: messenger, auth, sms-node, core-types

DEPLOYMENT STATUS

Infrastructure

Компонент	Статус	Готовность	Notes
Ubuntu 22.04	Ready	100%	OS сервера
Docker	Ready	100%	Containerization
Docker Compose	Ready	100%	Orchestration
PostgreSQL 15	Config	70%	Database
Redis 7	Config	70%	Cache + sessions
Let's Encrypt SSL	Not Started	0%	HTTPS
Yandex Disk OAuth	In Dev	50%	File storage
Android SMS-node	In Dev	30%	OTP delivery

Docker Services

Service	Image	Статус	Ports
postgres	postgres:15	Ready	5432
redis	redis:7-alpine	Ready	6379
balloo	custom	In Dev	3000
messenger	custom	Ready	3001
admin	custom	Not Started	3002
api	custom	In Dev	3003
workdocs	custom	In Dev	3004
kodegen	custom	Not Started	3005
nodes-switcher	custom	In Dev	3006
working	custom	In Dev	3007

 METRICS DASHBOARD

Development Metrics

Metric	Current	Target	Status
Documentation Files	77+	80	96%
Code Completion	50%	100%	50%
Test Coverage	15%	35%	43%

Metric	Current	Target	Status
Nodes Ready	1/8	8/8	12.5%
Auth Providers	2/3	3/3	67%
Core Packages	3/7	7/7	43%

Timeline Metrics

Phase	Start	End	Days Left	Progress
Phase 1	2026-06-14	2026-06-22	8 дней	70%
Phase 2	2026-06-23	2026-07-07	23 дня	10%
Phase 3	2026-07-08	TBD	—	0%

⚠ RISKS & BLOCKERS

Critical Risks

Risk	Impact	Probability	Mitigation
SMS-узел не готов	High	Medium	Резервный email OTP
Yandex Disk OAuth задерживается	Medium	Low	Локальное хранилище (temp)
Недостаточно тестов	High	High	Увеличить приоритет тестирования

Blockers

- ☐ Android SMS-узел требует физическое устройство
- ☐ Yandex OAuth credentials нужны для продакшена
- ☐ SSL сертификат требует публичный IP

☑ NEXT STEPS (Phase 1)

Неделя 1 (2026-06-14 — 2026-06-20)

- ☐ Завершить core-ui компоненты (30 шт.)
- ☐ Реализовать Android SMS-узел
- ☐ Настроить Yandex Disk OAuth
- ☐ Развернуть PostgreSQL + Redis на сервере
- ☐ Настроить Docker Compose для 8 узлов
- ☐ Получить SSL сертификат (Let's Encrypt)

Неделя 2 (2026-06-21 — 2026-06-22)

- ☐ Интеграционное тестирование
- ☐ Нагрузка: 6,000 пользователей (тест)
- ☐ Финальный деплой на Ubuntu
- ☐ Documentation completion
- ☐ Phase 1 acceptance




RECENT COMMITS

Commit	Message	Date	Author
b95ac7e	BRAND_ASSETS_MIGRATION_REPORT.md	2026-06-14	Koda
0edbbd0	BALLOO-BUILD-20260614-003: Move logo assets to core-brand	2026-06-14	Koda
8b9ff11	PROJECT_STATUS.md - Live dashboard	2026-06-14	Koda
11df3b4	BALLOO-BUILD-20260614-002: balloo.su + core-brand → Phase 1	2026-06-14	Koda
ea8767c	BALLOO-BUILD-20260614-001: Build Specification	2026-06-14	Koda
d22be97	AUTH-PROVIDERS-001: Auth Documentation	2026-06-13	Koda
ff76481	REPO-AUDIT: Repository Audit Complete	2026-06-13	Koda



PROGRESS CHART

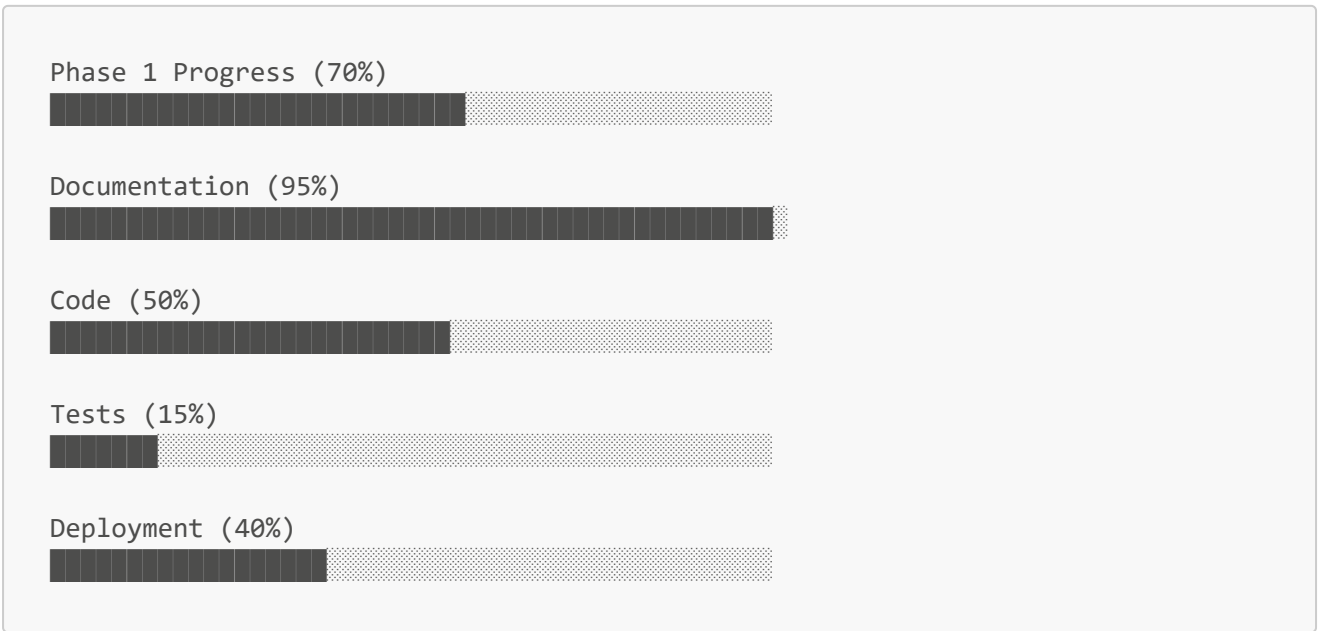

SUCCESS CRITERIA (Phase 1)

Must Have

- ☒ 8 узлов развёрнуты и работают
- ☐ 3 auth провайдера активны
- ☒ 4 роли работают
- ☐ Messenger отправляет/получает сообщения
- ☐ Файлы сохраняются на Яндекс.Диск
- ☐ SMS-узел отправляет OTP
- ☐ Stats Dashboard показывает метрики
- ☐ 35%+ test coverage
- ☒ Deploy инструкция работает на Ubuntu 22.04

Nice to Have

- ☐ E2E шифрование для чатов
- ☐ Видео/аудио конвертация в WebM
- ☐ Автоматическое масштабирование SMS

CONTACTS

Role	Name	Email	Phone
Project Owner	Оберюхтин Иван Анатольевич	o8eryuhtin@yandex.ru	+7 (929) 216-75-85
Lead Developer	—	—	—
DevOps	—	—	—
QA Lead	—	—	—

 **Balloo - Проверни общение!**

Последнее обновление: 2026-06-14

Следующее обновление: 2026-06-15 (ежедневно)

Статус:  In Development (Phase 1)
